

**PERÚ**Ministerio  
de Agricultura y Riego

Fecha: 13 de marzo de 2017

**PROYECTO: "INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA LAGUNA TAMPUSH EN LA LOCALIDAD DE HUACCHIS, DISTRITO DE HUACCHIS - HUARI - ANCASH"****CÓDIGO SNIP: 199566****1. INFORMACION DE LA OBRA.**

Proceso	:	L.P. N° 017-2013-MINAGRI-PSI
Monto Expediente Técnico (Actualizado)	:	S/. 7'644,076.92 (Incl. IGV)
<b>CONTRATISTA</b>	:	<b>CROVISA SAC</b>
Contrato de Ejecución de Obra	:	S/N
Fecha de firma de contrato	:	11 de febrero de 2014
Sistema de contratación	:	A Precios Unitarios
Monto total del contrato	:	S/. 5'848,404.87 (Incl. IGV)
Residente de obra	:	Ing. Julver Eddy Peralta Velásquez
	:	C.I.P.: 135807

<b>SUPERVISIÓN</b>	:	<b>CORPORACIÓN PERUANA DE INGENIERÍA</b>
Contrato de Supervisión de Obra	:	S/N
Firma del Contrato Supervisión	:	09 de enero de 2014
Monto total Contrato Supervisión	:	S/. 451,539.63 (Incl. IGV)
Jefe Supervisión	:	Ing. Lorgio Poncio Solórzano Vidal
	:	C.I.P.: 56133

<b>DATOS DE PROGRAMACIÓN</b>	:	
Fecha de Entrega de terreno	:	02 de junio de 2014
Fecha de Inicio de plazo	:	03 de junio de 2014
Plazo Contractual	:	180 días calendario
Término Contractual	:	29 de noviembre de 2014
Fecha Vigente (ampliaciones de plazo)	:	10 de octubre de 2016
Término Real	:	24 de octubre 2016 (C.O. Asiento N° 621)
Adelanto Directo	:	S/. 1'169,680.97 (Incl. IGV)
Adelanto de Materiales	:	S/. 2'339,361.95 (Incl. IGV)
Avance Financiero	:	99.79%
Avance Físico	:	99.80% (ADIC.3 = 99.60%)

**2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA.**

Departamento	:	Ancash
Provincia	:	Huari
Distrito	:	Huacchis
Localidades	:	Huacchis

**3. LOCALIZACIÓN COORDENADAS UTM.**

ZONA DEL PROYECTO			
REPRESA		TOMA Y DESCARGA DE FONDO	
Norte	8982412.04	Norte	8982443.30
Este	300176.01	Este	300188.93
Altura	4135 msnm	Altura	4123 msnm
Zona	18 L	Zona	18 L

**PERÚ**Ministerio  
de Agricultura y Riego

Fecha: 13 de marzo de 2017

**4. RUTAS DE ACCESO.**

DESDE	HASTA	DISTANCIA (KM)	TIEMPO EN CAMIONETA (HORAS)
Lima	Paramonga	207	3.30 horas
Paramonga	Cátac	200	4.00 horas
Cátac	Huari (Pomachaca)	100	2.30 horas
Pomachaca	Huacchis	90	3.30 horas

**5. METAS DEL PROYECTO.**

Las principales metas del proyecto son las siguientes:

- ✓ Construcción de trocha carrozable de 5+920 Km.
- ✓ Construcción de la Represa Tampush y sus obras conexas.

**6. BENEFICIARIOS Y ÁREAS A IRRIGAR.**

El área total beneficiada con el Proyecto es de **200 has**, con un total de **480 familias**.

**7. CARTAS FIANZA.**

N°	NÚMERO DE CARTA	CONCEPTO	FINANCIERA	FECHA VIGENTE
01	010432781-013	ADL	SCOTIABANK	17/01/2017
02	010448802-010	ADM	SCOTIABANK	09/02/2017
03	000713066090	ADIC1-ADIC2	BANCO FINANCIERO	03/07/2017

**8. ADICIONALES Y/O DEDUCTIVOS APROBADOS.**

N°	ADICIONAL	DEDUCTIVO	RESOLUCIÓN DIRECTORAL
01	S/. 186,795.96	S/. 124,315.55	RD N°154-2015-MINAGRI-PSI
02	S/. 174,483.68	S/. 0.00	RD N°846-2015-MINAGRI-PSI
03	S/. 786,865.09	S/. 153,677.16	RD N°811-2015-MINAGRI-PSI

**9. AMPLIACIONES DE PLAZO.**

N°	RESOLUCIÓN	DIAS	FECHA VIGENTE
01	RD N°578-2014-MINAGRI-PSI		Improcedente
02	RD N°595-2014-MINAGRI-PSI		Improcedente
03	RD N°819-2014-MINAGRI-PSI	23	12/12/14
04	RD N°001-2015-MINAGRI-PSI	23	05/01/15
05	RD N°068-2015-MINAGRI-PSI	21	27/01/15
06	RD N°156-2015-MINAGRI-PSI	28	26/02/15
07	RD N°210-2015-MINAGRI-PSI	28	26/03/15
08	RD N°253-2015-MINAGRI-PSI	26	14/04/15
09	RD N°340-2015-MINAGRI-PSI	28	21/05/15
10	RD N°404-2015-MINAGRI-PSI	43	15/06/15
11	RD N°492-2015-MINAGRI-PSI	21	30/07/15

**PERÚ**Ministerio  
de Agricultura y Riego

Fecha: 13 de marzo de 2017

12	RD N°546-2015-MINAGRI-PSI	21	14/08/15
13	RD N°606-2015-MINAGRI-PSI	21	04/09/15
14	RD N°636-2015-MINAGRI-PSI	21	23/09/15
15	RD N°686-2015-MINAGRI-PSI	21	23/10/15
16	RD N°726-2015-MINAGRI-PSI	21	23/11/15
17	RD N°823-2015-MINAGRI-PSI	21	04/12/15
18	RD N°903-2015-MINAGRI-PSI	162	14/05/16
19	RD N°241-2016-MINAGRI-PSI	132	23/09/16
20	RD N°261-2016-MINAGRI-PSI	-	Improcedente
21	RD N°326 -2016-MINAGRI-PSI	17	10/10/2016
22	RD N°458-2016-MINAGRI-PSI	14	24/10/2016

**10. VALORIZACIONES.**

N°	DESCRIPCIÓN	VALORIZACIÓN S/.
01	Suma total Valorización Contractual	2,377,051.40
02	Suma total Valorización Adicional N°01	222,100.39
03	Suma total Valorización Adicional N°02	172,844.45
04	Suma total Valorización Adicional N°03	437,512.85
<b>TOTAL S/.</b>		<b>S/. 3'209,509.09</b>

A la fecha se ha cancelado la suma de S/. 3'209,509.09 soles, quedando un saldo a cancelar de S/. 599,014.59 Soles, según reporte de Estado de Cuenta.

**11. EJECUCIÓN FINANCIERA.**

Cuadro resumen de la Información de la ejecución financiera mensualizada a la fecha.

Ejecutoras		Pim	Dev															
		Acum.	Acum.															
PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACION - PSI AGRICULTURA - M. DE AGRICULTURA Y RIEGO		15,503,578	7,267,522.44															
Año	Pia.	Pim. Acum.	Dev. Acum.	Devolución Mensualizada												Compromiso Anual	Certificación	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
2013	C	5,879,646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	C	6,270,888	5,113,206	0	1,169,667.97	0	0	0	0	0	2,755,645.86	717,802.43	306,266.14	510,600.77	27,737.67	6,260,665.16	6,257,663.13	
2015	C	1,254,761	444,859.69	0	165,756.47	4,347.33	0	0	0	69,744.06	45,540.84	0	60,000	0	200,110.99	444,665.69	444,859.69	
2016	L	2,100,000	1,712,002.36	0	0	0	0	0	0	0	0	1,093.69	616,000.00	6,127,000	0	1,712,002.36	1,712,002.36	
Fuente: Flujos de efectivo		Año	Pim	Dev														
CANCN Y SOBRECANCN, REGALIAS, BENEFICIOS ADELANTADOS Y PARTICIPACIONES		2013	5,879,649	0														
CANCN Y SOBRECANCN, REGALIAS, BENEFICIOS ADELANTADOS Y PARTICIPACIONES		2014	5,200,382	5,110,620.5														
CANCN Y SOBRECANCN, REGALIAS, BENEFICIOS ADELANTADOS Y PARTICIPACIONES		2015	1,334,261	444,869.69														
CANCN Y SOBRECANCN, REGALIAS, BENEFICIOS ADELANTADOS Y PARTICIPACIONES		2016	2,088,553	1,712,002.36														

**12. AVANCE FÍSICO.**

El avance físico acumulado hasta la fecha es de **99.80%**.



PERÚ


Ministerio de Agricultura y Riego



Fecha: 13 de marzo de 2017

### 13. CURVA "S".

Avance Físico Global (Obra Principal + Adicionales - Deductivos).

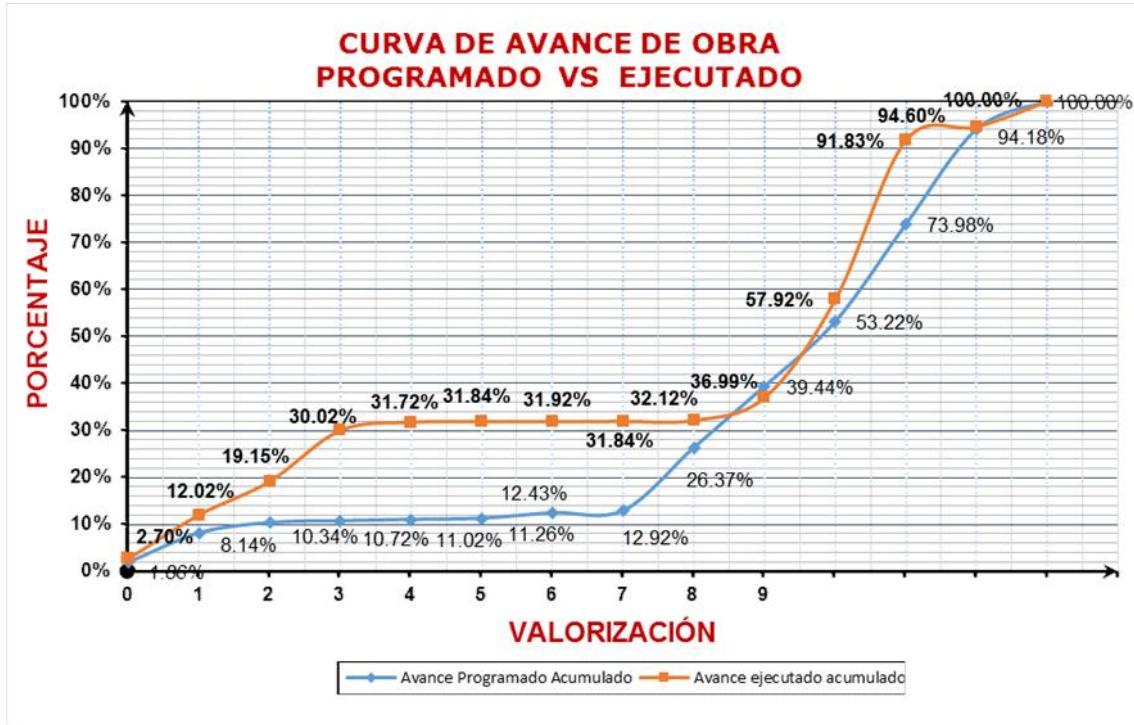

### 14. SITUACIÓN ACTUAL DE LA OBRA (marque con una X).

NORMAL	<input type="checkbox"/>
ATRASADA	<input type="checkbox"/>
PARALIZADA	<input type="checkbox"/>
CULMINADA	<input checked="" type="checkbox"/>
Situación Actual	<b>EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN.</b>

### CONCLUSIONES:

La obra tiene un avance físico acumulado de 100.00 % de la obra principal y un avance físico acumulado de 99.60 % del Adicional de Obra N° 03.

El 0711/2016 mediante R.D-N°503-2016-MINAGRI-PSI se conformó el comité de Recepción y Transferencia para realizar la verificación de los trabajos de ejecución de la obra.

Con fecha del 01 de diciembre 2016 se recepcionó y se transfirió a la Junta de Usuarios correspondiente.

Con fecha del 24/01/2017 se presentó a la Entidad La liquidación Final del contrato de Obra, el cual viene siendo revisado por el Consultor contratado por la Entidad. Teniendo como plazo máximo para el pronunciamiento el 24/03/2017.

Ing.	<b>CIRILA BACA ESLAVA</b>
Seguimiento y Monitoreo de Ejecución de Obras – SIERRA AZÚL	
C.I.P.:	47822



PERÚ

Ministerio  
de Agricultura y Riego



Fecha: 13 de marzo de 2017

## PANEL FOTOGRÁFICO

(10 Fotos, solo obra como mínimo de la última visita)



Calle Teniente Emilio Fernandez N°130 - Santa Beatriz - Lima  
T: (511) 424-4488  
[www.psi.gob.pe](http://www.psi.gob.pe)  
[www.minagri.gob.pe](http://www.minagri.gob.pe)



Trabajando para  
todos los peruanos



PERÚ

Ministerio  
de Agricultura y Riego



Fecha: 13 de marzo de 2017



Calle Teniente Emilio Fernandez N°130 - Santa Beatriz - Lima  
T: (511) 424-4488  
[www.psi.gob.pe](http://www.psi.gob.pe)  
[www.minagri.gob.pe](http://www.minagri.gob.pe)



*Trabajando para  
todos los peruanos*



PERÚ

Ministerio  
de Agricultura y Riego



Fecha: 13 de marzo de 2017



Calle Teniente Emilio Fernandez N°130 - Santa Beatriz - Lima  
T: (511) 424-4488  
[www.psi.gob.pe](http://www.psi.gob.pe)  
[www.minagri.gob.pe](http://www.minagri.gob.pe)



*Trabajando para  
todos los peruanos*



PERÚ

Ministerio  
de Agricultura y Riego



Fecha: 13 de marzo de 2017



Calle Teniente Emilio Fernandez N°130 - Santa Beatriz - Lima  
T: (511) 424-4488  
[www.psi.gob.pe](http://www.psi.gob.pe)  
[www.minagri.gob.pe](http://www.minagri.gob.pe)



Trabajando para  
todos los peruanos





PERÚ

Ministerio  
de Agricultura y Riego



Fecha: 13 de marzo de 2017



Calle Teniente Emilio Fernandez N°130 - Santa Beatriz - Lima  
T: (511) 424-4488  
[www.psi.gob.pe](http://www.psi.gob.pe)  
[www.minagri.gob.pe](http://www.minagri.gob.pe)



Trabajando para  
todos los peruanos
